
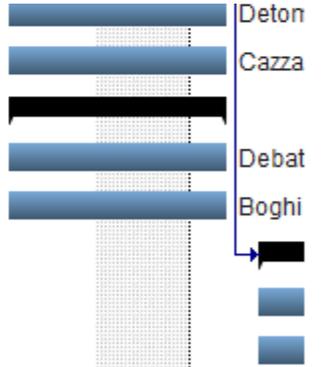



	i	Nome	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Risorse	Mag 4 - Mag 10 '15			
								L	M	M	G
1		☐ Operazioni preliminari	14g	12/05/2015	29/05/2015						
2		Acquisizione Ordine	1g	12/05/2015	12/05/2015						
3		Acquisizione materiali Cad	7g	21/05/2015	29/05/2015						
4		Ricerca informazioni	9g	13/05/2015	25/05/2015			Boghi Massimilia			
5		Miglioramento skills personali	7g	21/05/2015	29/05/2015			Boghi Massimilia			
6		Definizione requisiti e specifiche di progetto	4g	22/05/2015	27/05/2015			Boghi Massimilia			
7		☐ Analisi Frequenza di risonanza	11g	01/06/2015	15/06/2015	1					
8		☐ Realizzazione modelli Cad	5g	01/06/2015	05/06/2015	3					
9		☐ Realizzazione in CATIA	5g	01/06/2015	05/06/2015						
10		Sistema Hard	5g	01/06/2015	05/06/2015			Detomas Simon			
11		Sistema Soft	5g	01/06/2015	05/06/2015			Cazzaniga Cesa			
12		☐ Realizzazione in Inventor	5g	01/06/2015	05/06/2015						
13		Sistema Hard	5g	01/06/2015	05/06/2015			Debattisti Nicola			
14		Sistema Soft	5g	01/06/2015	05/06/2015			Boghi Massimilia			
15		☐ Analisi Joint Simulator	3g	08/06/2015	10/06/2015	8					
16		☐ Analisi in CATIA	3g	08/06/2015	10/06/2015						
17		Sistema Hard	3g	08/06/2015	10/06/2015			Detomas Simon			
18		Sistema soft	3g	08/06/2015	10/06/2015			Cazzaniga Cesa			
19		☐ Analisi in Inventor	3g	08/06/2015	10/06/2015						
20		Sistema Hard	3g	08/06/2015	10/06/2015			Debattisti Nicola			
21		Sistema Soft	3g	08/06/2015	10/06/2015			Boghi Massimilia			
22		☐ Analisi sistema completo	3g	11/06/2015	15/06/2015	8,15					
23		☐ Analisi in CATIA	3g	11/06/2015	15/06/2015						

24		Sistema Hard	3g	11/06/2015	15/06/2015		Detomas Simon
25		Sistema Soft	3g	11/06/2015	15/06/2015		Cazzaniga Cesa
26		☐ Analisi in Inventor	3g	11/06/2015	15/06/2015		
27		Sistema Hard	3g	11/06/2015	15/06/2015		Debattisti Nicola
28		Sistema Soft	3g	11/06/2015	15/06/2015		Boghi Massimilia
29		☐ Studio dei risultati	6g	16/06/2015	23/06/2015	7	
30		Analisi simulazioni Fem	2g	16/06/2015	17/06/2015		Boghi Massimilia
31		Comparazione e compatibilità dei risultati	2g	16/06/2015	17/06/2015		Debattisti Nicola
32		Analisi delle problematiche	4g	18/06/2015	23/06/2015	31	Boghi Massimilia
33		☐ Refinement del prodotto	14g	24/06/2015	13/07/2015	29	
34		Valutazione delle possibili soluzioni	5g	24/06/2015	30/06/2015		Boghi Massimilia
35		Scelta della soluzione migliore	3g	01/07/2015	03/07/2015	34	Boghi Massimilia
36		☐ Ottimizzazione della soluzione	4g	06/07/2015	09/07/2015	35	
37		Ottimizzazione in CATIA	4g	06/07/2015	09/07/2015		Cazzaniga Cesa
38		Ottimizzazione in Inventor	4g	06/07/2015	09/07/2015		Boghi Massimilia
39		☐ Verifica finale	2g	10/07/2015	13/07/2015	36	
40		Verifica in CATIA	2g	10/07/2015	13/07/2015		Cazzaniga Cesa
41		Verifica in Inventor	2g	10/07/2015	13/07/2015		Boghi Massimilia
42		☐ Esposizione lavoro	5g	14/07/2015	20/07/2015	33	
43		Elaborazione pagina WEB	5g	14/07/2015	20/07/2015		Debattisti Nicola
44		Elaborazione presentazione Power Point	3g	14/07/2015	16/07/2015		Boghi Massimilia



Giu 21 '15					Giu 22 - Giu 28 '15						Giu 29 - Lug 5 '15						Lug 6 - Lug 12 '15						Lug 13 - Lug 19 '15						Lug 20 - Lug 26 '15					
M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D		
Simone[25% 5%]																																		

1as Simone
niga Cesare

tisti Nicola
Massimiliano

